FOTOVOLTAICA UFSC:
Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina
www.fotovoltaica.ufsc.br

Coordenador
Prof. Ricardo Rüther

[P&D ENGIE/UFSC – RELATÓRIO BIMESTRAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – Novembro/2021]

"Relatório bimestral de manutenção preventiva dos sistemas de armazenamento de energia com integração à rede elétrica em residências"

Novembro/2021


fotovoltaicaufsc


ARAXÁ
ENERGIA SOLAR

[EQUIPE FOTOVOLTAICA-UFSC:

Alexandre de Albuquerque Montenegro	*Eng. Mecânico, Mestre Eng. Civil*
Álvaro Della Justina do Nascimento	*Eng. Eletricista*
Aline Kirsten Vidal de Oliveira	*Eng.ª Eletricista*
Amanda Mendes Ferreira Gomes	*Eng.ª Eletricista*
Andrigo Filippo Gonçalves Antoniolli	*Eng. Civil, Mestre em Eng. Civil*
Anelise Medeiros Pires	*Eng.ª Eletricista*
André Luiz Prado Cechinel	*Eng. Eletricista*
Angélica Paula Caus	*Eng.ª Eletricista*
Carlos Eduardo Possamai	*Eng. De Contr. e Auto., Mestre Eng. Contr. e Automação*
Caroline Bedin	*Engª. Eletricista*
Clarissa Debiazi Zomer	*Arquiteta, Dr. Eng. Civil*
Daniel Odilio dos Santos	*Eng. Eletricista*
Gabriel de Oliveira Assunção	*Eng. Eletricista, Mestre Eng. Elétrica*
Giuliano Luchetta Martins	*Acad. Eng. Mecânica*
Gustavo Xavier de Andrade Pinto	*Eng. Eletricista, Mestre Eng. Civil*
Prof. Ivo Barbi	*Eng. Eletricista, Dr. Eng. Elétrica*
Prof. Helena Flávia Naspolini	*Eng.ª Eletricista, Dr. Eng. Civil*
Isadora Pauli Custodio	*Arquiteta, Mestre Eng. Civil*
João Martins Junior	*Eng. Eletricista, Mestre Eng. Elétrica*
João Victor Assis da Silveira	*Acad. Eng. Controle e Automação*
Juliane Silva de Almeida	*Eng.ª Eletricista, Mestre Eng. Elétrica*
Julio Boing Neto	*Eng. Eletricista*
Kathlen Schneider	*Eng.ª Civil, Mestre Eng. Civil*
Leonardo Freire Pacheco	*Eng.ª Eletricista, Mestre Eng. Elétrica*
Lucas Parmigiani Zanchetta	*Eng. De Energia*
Lucas Rafael do Nascimento	*Eng. Eletricista, Dr. Eng. Civil*
Manfred Georg Kratzenberg	*Eng. Eletricista, Mestre Eng. Mecânica*
Marília Braga	*Eng.ª Eletricista*
Matheus Hohmann	*Acad. Eng. Elétrica*
Natan Bernardo Nicolli	*Eng. Eletricista, Mestre Eng. Elétrica*
Nikolas dos Santos Barbosa	*Acad. Eng. Civil*
Pedro Henrique Alves Veríssimo	*Eng. Eletricista, Mestre Eng. Civil*
Rafael Antunes Campos	*Eng. Eletricista, Mestre Eng. Civil*
Ruany Dolla	*Eng.ª Eletricista*
Sabrina Rodrigues Ebert	*Acad. Eng. Elétrica*
Tallys Lins Almeida Barbosa	*Eng. Eletricista, Mestre Eng. Elétrica*
Vitor Volpato Goulart	*Acad. Eng. Elétrica*
Ygor Pereira Marca	*Eng. Eletricista, Mestre Eng. Elétrica*

Coordenador: Prof. Ricardo Rüther, Ph.D.]

[EQUIPE ARAXÁ SOLAR:
Victória Schmidt Farias — *Gestão Contratual/Eng.ª Civil*
Vitor Bairrão — *Técnico em Eletrotécnica/Araxá Solar*

[ELABORAÇÃO:
Vitor Bairrão — *Técnico em Eletrotécnica/Araxá Solar*

[REVISÃO:
Victória Schmidt Farias — *Gestão Contratual/Eng.ª Civil*
Amanda Mendes Ferreira Gomes — *Eng.ª Eletricista/Fotovoltaica-UFSC*



Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC
Laboratório FOTOVOLTAICA-UFSC
Sapiens Parque - Av. Luiz Boiteux Piazza, 1302 - Lotes 114/115
Cachoeira do Bom Jesus - Florianópolis/SC - CEP:88056-000
www.fotovoltaica.ufsc.br

1 INTRODUÇÃO 6
2 OBJETIVO 6
3 ESCOPO DOS SERVIÇOS prestados E PROPOSTA INICIAL 6
3.1 MANUAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SELECIONADOS 6
3.2 GARANTIA DA INSTALAÇÃO 7
3.3 VISITAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 7
4 MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS 10
5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 10
6 RELATÓRIO BIMESTRAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 11
6.1 RESUMO DA VISITA À RESIDÊNCIA 1 – JOÃO PAULO 11
6.1.1 Checklist de verificações realizadas na residência 1 15
6.2 RESIDÊNCIA 2 – PRAIA DE FORA 18
6.2.1 Checklist de verificações realizadas na residência 2 22
6.3 RESIDÊNCIA 3 – CACUPÉ 24
6.3.1 Checklist de verificações realizadas da Residência 3 28
6.4 RESIDÊNCIA 4 – JURERÊ 30
6.4.1 Checklist de verificações realizadas da Residência 4 33
6.5 RESIDÊNCIA 5 – PANTANAL 35
6.5.1 Checklist de verificações realizadas na residência 5 39
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 43

1 INTRODUÇÃO

O Projeto de P&D ENGIE/UFSC, da chamada estratégica P&D 021/2016 da ANEEL tem como um de seus objetivos aplicações em geração distribuída de pequeno porte residencial. No escopo, está a integração de sistemas de acumulação de pequeno porte em 5 (cinco) residências, que já possuem um telhado solar fotovoltaico (FV), com o objetivo de avaliar os benefícios de um sistema de acumulação de energia (*back-up*) em ambiente de tarifa branca, com geração fotovoltaica.

Este relatório apresenta um resumo das inspeções e medidas preventivas e corretivas realizadas durante as primeiras visitas de manutenção preventiva realizadas em novembro de 2021.

2 OBJETIVO

O objetivo do relatório bimestral de manutenção preventiva é relatar os testes e processos de manutenção preventiva e/ou corretiva realizados pela CONTRATADA (Araxá Solar) com auxílio do Laboratório Fotovoltaica-UFSC relacionados à instalação e parametrização dos sistemas de armazenamento de energia e sistema de sensores nas residências selecionadas localizadas nas cidades de Florianópolis – SC e Palhoça – SC.

Os cinco sistemas de armazenamento possuem os mesmos equipamentos e especificações. Já os sistemas fotovoltaicos instalados previamente em cada uma das residências variam substancialmente, tanto com relação aos equipamentos e módulos FV utilizados, quanto ao porte de cada sistema.

As atividades contempladas por este relatório são detalhadas ao longo do documento, e consistem das etapas abaixo:

a) Apresentação do procedimento aplicado à cada residência;
b) Apresentação de informações de cada residência, separadamente.
    i. Data da visita;
    ii. Responsáveis pela visita;
    iii. Fotos dos equipamentos;
    iv. Fotos termográficas dos equipamentos;
    v. Checklist de verificações realizadas;
    vi. Relato detalhado das falhas encontradas.

3 ESCOPO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E PROPOSTA INICIAL

3.1 MANUAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SELECIONADOS

Os equipamentos utilizados tais como baterias, inversores, sistema de aquisição de dados e demais dispositivos serão fornecidos pela CONTRATANTE. Os manuais para manutenção dos equipamentos selecionados listados abaixo foram repassados à CONTRATADA pelo Laboratório Fotovoltaica-UFSC no momento da contratação dos serviços.

- Bateria de Lítio, do fabricante BYD (**ANEXO I**);

- Inversor da Bateria e Medidor, do fabricante SMA (**ANEXO II**).

É importante notar que na ocasião de existir versões mais atualizadas dos manuais e/ou alterações vindas diretamente do fabricante, as versões mais atualizadas devem ser consideradas e tais mudanças devem ser previamente informadas à CONTRATANTE.

Para os equipamentos do sistema de aquisição de dados e medidores de energia, conforme indicados abaixo, não existe material de manutenção. A manutenção, quando necessária e se dentro da garantia, é realizada pelas assistências técnicas autorizadas de cada fornecedor.

- Sensor de velocidade do vento: *Wind Speed Sensor Compact*, do fabricante Meteocontrol;
- Sensor de irradiância: *Irradiance Sensor Si-Series*, do fabricante Meteocontrol;
- Sensor de temperatura do módulo: *PT1000 Adhesive Sensor*, do fabricante Meteocontrol;
- Sensor de temperatura ambiente: *PT1000 Sensor in Enclosure*, do fabricante Meteocontrol;
- Datalogger: Bluelog X-1000, do fabricante Meteocontrol;
- Medidor de energia *Schneider*: *IEM3155 – Energy Meter*, do fabricante *Schneider Electric*;
- Switch gerenciável - *Switch Cisco 08 Portas SF302-08 SRW208G-K9-Na 10/100*, do fabricante Cisco.

3.2 GARANTIA DA INSTALAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a garantir os serviços executados contra qualquer defeito de mão-de-obra e/ou estrutura, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados de seu recebimento final pela CONTRATANTE, conforme disposto no artigo 618 e seguintes da Lei 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil). O término do prazo de garantia não prejudica ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA pelas perdas e danos que acarretar.

A CONTRATADA obriga-se a garantir os materiais, equipamentos e disponibilidade do sistema contra qualquer defeito de instalação realizados por sua equipe, pelos respectivos prazos específicos definidos no contrato inicial, conforme disposto no artigo 618 e seguintes da Lei 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil). O término do prazo de garantia não prejudica ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA pelas perdas e danos que acarretar.

3.3 VISITAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para o bom funcionamento dos equipamentos e da instalação do sistema de armazenamento é necessário um acompanhamento periódico. Para tal, devem ocorrer manutenções preventivas com periodicidade mínima de 60 dias. A **TABELA 1** apresenta o detalhamento das manutenções preventivas previstas no escopo de serviços da CONTRATADA.

TABELA 1 – DETALHAMENTO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS

EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NECESSÁRIAS	QUANDO
SISTEMA DE POTÊNCIA		
Quadros elétricos C.C e C.A do sistema FV e do sistema de armazenamento	Todos os quadros elétricos C.C e C.A do sistema FV e do sistema de armazenamento deverão ser inspecionados utilizando uma câmera termográfica. Qualquer não homogeneidade de temperatura, em virtude de mau contato ou falha nos terminais, deverá ser avaliada e corrigida.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
Bateria de Lítio Mod.: B-Box battery Storage **Fabricante: BYD**	A bateria deve ser limpa periodicamente. Se o gabinete estiver sujo, usar uma escova macia seca ou um soprador de fuligem para remover a poeira. Líquidos como solventes, abrasivos ou líquidos corrosivos não podem ser empregados na limpeza do gabinete.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
	Realizar medições termográficas nos terminais da bateria avaliando não homogeneidade de temperatura entre condutores e terminais	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
Inversor da Bateria Mod.: Sunny Island 6.0H Fabricante: SMA	O inversor da bateria deve ser limpo periodicamente. Se o inversor estiver sujo, limpar o invólucro, a tampa do invólucro, a etiqueta de tipo e os LEDs usando apenas um pano umedecido. Verificar se o inversor está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
	Verificar as mensagens de erro registradas. Isso revelará quaisquer erros ocultos na instalação ou configuração. Para mais informações acessar a sessão “11.4 Checking the Function” do ANEXO II.	CONTRATADA deve analisar semanalmente de maneira remota e visitar a residência em caso de necessidade.
	Verificar se os cabos nas conexões DC + e DC– estão bem presos (torque: 12 Nm), se as conexões estão livres de corrosão e se os cabos nas conexões AC1 e AC2 estão firmemente presos. Para mais informações acessar a sessão “11.5 Checking the Connections” do ANEXO II.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
	Realizar medições termográficas nos terminais do inversor avaliando não homogeneidade de temperatura entre condutores e terminais	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
	Verificar se o estado atual da bateria corresponde ao estado esperado. Para mais informações acessar a sessão “11.6 Checking and Maintaining the Battery” do ANEXO II.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
	Verificar o ventilador. Em caso de aviso “W137 Derate” com frequência, um dos ventiladores provavelmente está com defeito ou bloqueado. Para isso é necessário fazer uma visita ao local e	Analisar semanalmente de maneira remota e

	limpar ou desbloquear o ventilador. Para mais informações acessar a sessão “11.7 Cleaning the Fans” do ANEXO II.	visitar a residência em caso de necessidade.
	Em caso de necessidade de substituição da bateria, acessar a sessão “11.8 Replacing the Battery” do ANEXO II para mais informações.	Em caso de necessidade.
SISTEMAS DE SENSORES		
Sensor de Velocidade do Vento Mod.: Wind Speed Sensor Compact Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
	Verificar a orientação para o norte do sensor de velocidade do vento.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
Sensor de Irradiância Mod.: Irradiance Sensor Si-Series Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
	Verificar a orientação e inclinação do sensor de irradiância no mesmo plano e orientação do sistema fotovoltaico da residência.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
Sensor de Temperatura do Módulo Mod.: PT1000 Adhesive Sensor Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o sensor de temperatura do módulo está colado na parte central de uma célula localizada no meio do módulo fotovoltaico.	Antes do início do funcionamento do sistema.
	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
	Verificar se a fita de fixação do sensor está bem acomodada.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
Sensor de Temperatura Ambiente Mod.: PT1000 Sensor in Enclosure Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o sensor de temperatura ambiente está bem acomodado ao sistema fotovoltaico da residência.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
Datalogger Mod.: Bluelog X-1000 Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o datalogger está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
SISTEMAS AUXILIARES		

Home Manager Mod.: Sunny Home Manager 2.0 Fabricante: SMA	Verificar se o Home manager está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dais.
Medidor de Energia Mod.: IEM3155 – Energy Meter Fabricante: Schneider Electric	Verificar se o Medidor de Energia está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.
Switch Mod.: Switch Cisco SF352-08 8-port 10/100 Managed Fabricante: Cisco	Verificar se o switch está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Na visita da CONTRATADA a cada 60 dias.

4 MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS

A contratada, durante a realização das manutenções preventivas, poderá se deparar com a necessidade de substituição de equipamentos em virtude de falha ou mau funcionamento. A CONTRATANTE ficará responsável pelo fornecimento dos principais componentes do sistema (e.g. baterias, inversores, dataloggers, sensores, etc.). Caso a falha ocorra em algum componente da instalação do sistema (e.g. condutores, conectores, disjuntores, bornes, etc.) estes serão de inteira responsabilidade da contratada, tendo em vista que a compra e instalação dos materiais do sistema de armazenamento foram de sua responsabilidade.

Em virtude da imprevisibilidade das falhas associadas aos principais componentes do sistema, a CONTRATADA deverá estimar em sua proposta comercial o custo de Homem/Hora ou valor de mobilização para vez que esse serviço for necessário.

Todos os serviços de manutenção corretiva, assim que diagnosticados deverão ser realizados em um prazo de três dias úteis.

5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A CONTRATADA concorda que obteve antecipadamente todas as informações complementares a esta especificação e, portanto, entregará os relatórios dentro dos padrões existentes e exigidos pela CONTRATANTE.

No caso de dúvidas no escopo, deverá ser solicitado esclarecimento junto à CONTRATANTE. Qualquer informação divergente nos documentos listados deverá ser apresentada ao CONTRATANTE para que seja esclarecida formalmente.

6 RELATÓRIO BIMESTRAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Este item dedica-se a descrever separadamente as visitas realizadas em cada residência.

6.1 RESUMO DA VISITA À RESIDÊNCIA 1 – JOÃO PAULO

A residência 1, localizada no bairro João Paulo – Florianópolis, foi a quarta residência a ser visitada pela equipe de manutenção. A TABELA 2 indica a data e os responsáveis pela visita.

Tabela 2. Datas e responsáveis pelas visitas de manutenção preventiva – Residência 1

RESIDÊNCIA	RESPONSÁVEL	DATAS DAS VISITAS		RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO
Residência 1 João Paulo	Renato Del Frari	3º	05/11/2021	Vitor Bairrão Amanda Mendes Ferreira Gomes

Ao iniciar a rotina de manutenção preventiva, inspecionou-se visualmente o sistema como um todo e em seguida, os quadros de disjuntores, medição, comunicação, bem como o inversor *Sunny Island* foram abertos.

Enquanto a equipe UFSC verificava os portais virtuais a equipe Araxá inspecionou a instalação localizada no terraço da edificação, bem como os sensores e quadros de comunicação, localizados neste mesmo local. Em seguida, inspecionou-se os terminais dos quadros, inversores e bateria, localizados na garagem. Incluindo o quadro de disjuntores da residência, localizado na parte externa da garagem.

Por fim, finalizou-se a rotina de manutenção fechando todos os quadros, o inversor e a bateria. Nenhuma anomalia foi encontrada.

Na FIGURA 1 estão apresentadas as imagens feitas durante a visita técnica, contendo as imagens de cada setor da instalação.




Vista geral do sistema




Bateria BYD




Inversor FV

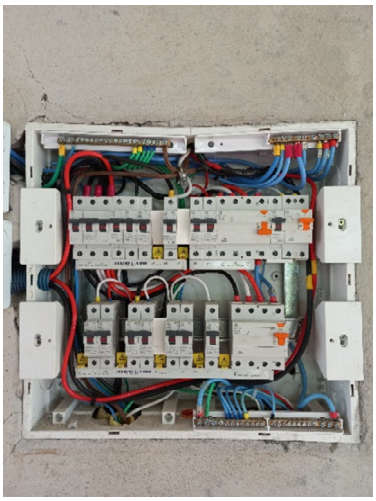


Quadro de disjuntores 1

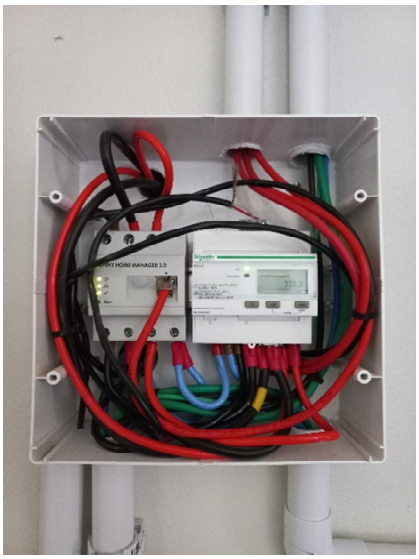


Quadro de medidores

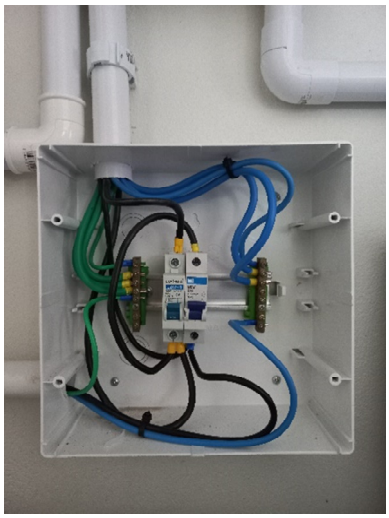

Quadro de disjuntores 2

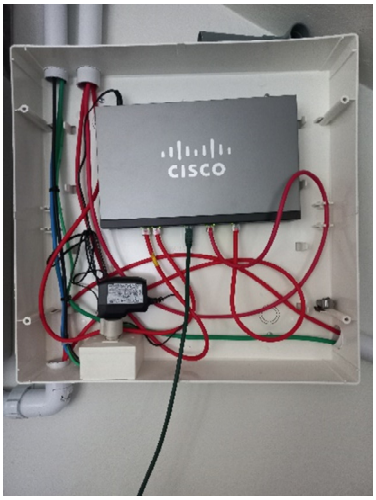


Quadro de Comunicação

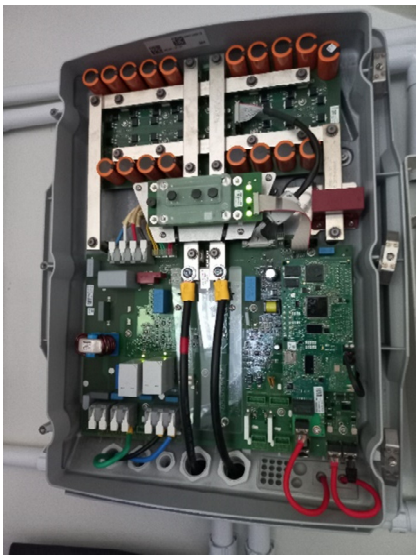


Inversor Sunny Island aberto




Bateria BYD aberta

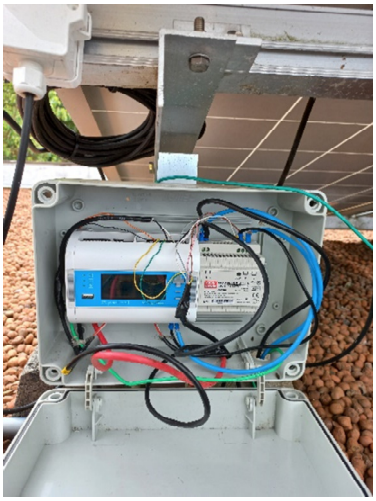

Caixa de comunicação 2

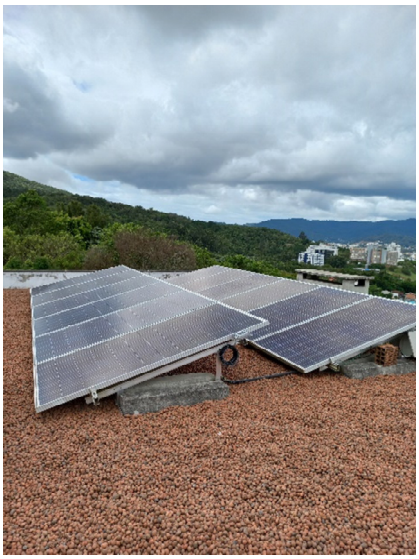


Sistema Fotovoltaico

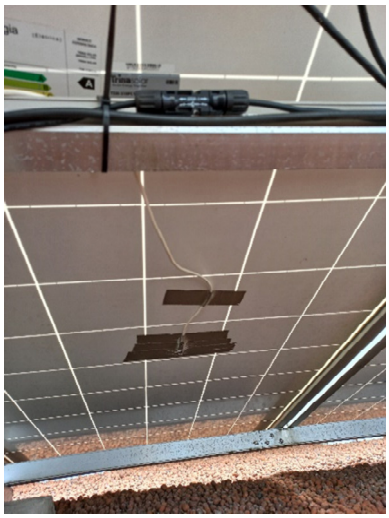

Sensor de temperatura do módulo



Sensor de velocidade do vento

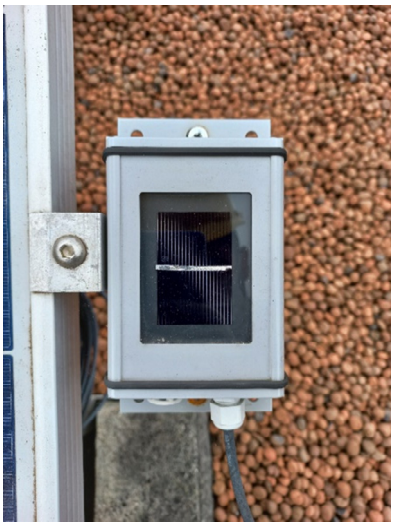


Célula de irradiância




Sensor de temperatura ambiente

Figura 1. Fotos do sistema de armazenamento, sensores e sistema FV da Residência 1.


Utilizou-se imagem termográfica para inspecionar o inversor *Sunny Island* e bateria *BYD*; contudo, nenhuma anomalia foi constatada, indicando um bom funcionamento do sistema. A FIGURA 2 apresenta as imagens termográficas dos medidores de energia, bateria *BYD*, inversor *Sunny Island*, quadro da residência e quadro de comunicação.

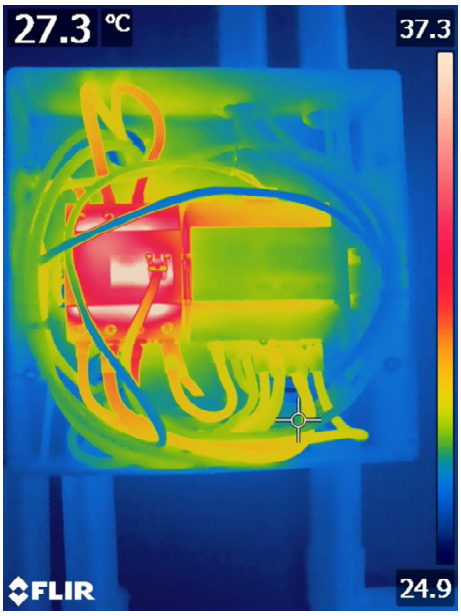


Medidores de energia

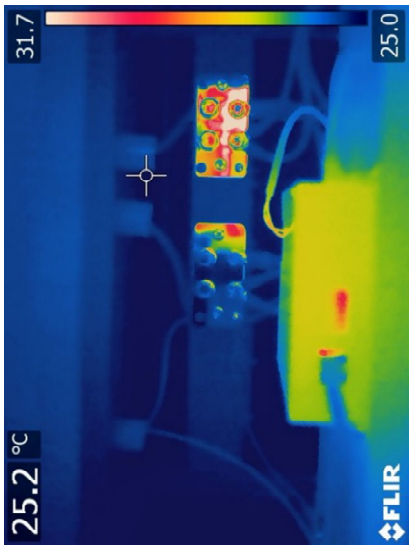


Bateria BYD

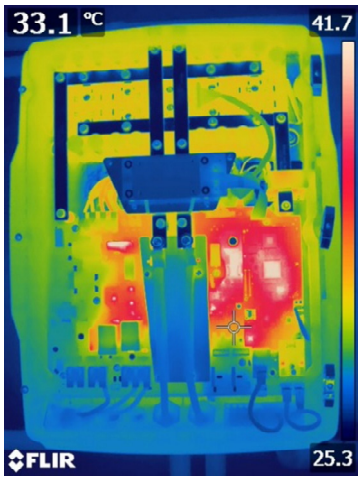

Sunny Island

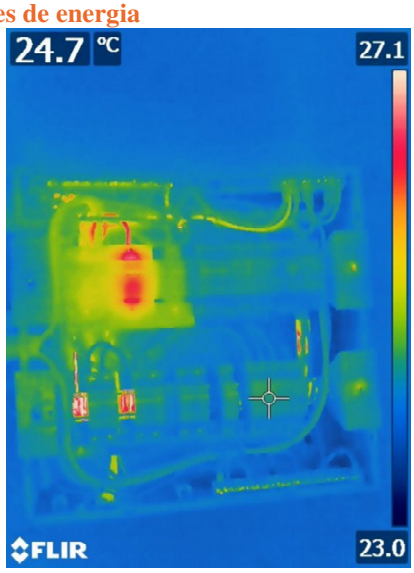

Quadro da Residência

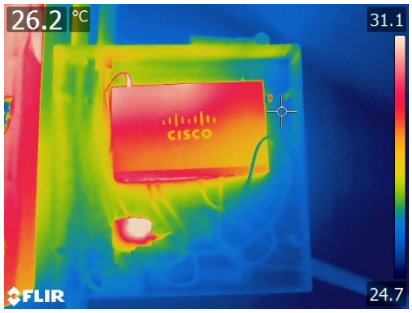

Quadro de Comunicação

Figura 2. Fotos termográficas do sistema de armazenamento, sensores e quadros da Residência 1.

Abaixo, na FIGURA 3, estão expostas as imagens Sunny Portal e do datalogger *Bluelog*, citados anteriormente.

ℹ	13/11/2021 23:58:00	SI6.0H-13 316	Estado: Ok	✔
ℹ	06/11/2021 01:27:30	SI6.0H-13 316	Estado: Ok	✔
ℹ	29/10/2021 01:33:00	SI6.0H-13 316	Estado: Ok	✔
ℹ	26/10/2021 09:21:40	Home Manager 2 155	Recep.dados do contad.forn.rede novam. OK	✔
ℹ	26/10/2021 09:21:40	Home Manager 2 155	Recep.dados do contad.aliment.rede novam. OK	✔
⊗	26/10/2021 09:18:15	Home Manager 2 155	Recep.dados do contad.forn.rede c/falhas	✔
⊗	26/10/2021 09:18:15	Home Manager 2 155	Recep.dados do contad.aliment.rede c/falhas	✔
ℹ	21/10/2021 01:17:00	SI6.0H-13 316	Estado: Ok	✔
ℹ	20/10/2021 07:44:54	Home Manager 2 155	Update vers. 2.07.5.R bem sucedido	✔
ℹ	18/10/2021 09:18:46	Home Manager 2 155	Comunicação com o aparelho restabelecida.	✔
⚠	18/10/2021 09:16:21	Home Manager 2 155	A comunicação com o Sunny Portal falhou durante 07:35 horas	✔
⚠	18/10/2021 02:54:52	Home Manager 2 155	Falha de comunicação: o contacto com o aparelho está atrasado (última recepção de dados: 18/10/2021 01:35:00)	✔
ℹ	18/10/2021 01:42:00	SI6.0H-13 316	Estado: Ok	✔
⊗	18/10/2021 01:06:35	SI6.0H-13 316	Comunicação com falha	✔
ℹ	14/10/2021 01:42:35	SI6.0H-13 316	Estado: Ok	✔
ℹ	07/10/2021 00:27:35	SI6.0H-13 316	Estado: Ok	✔

Figura 3. Registro diário dos eventos do sistema no portal Sunny Portal da Residência 1

6.1.1 Checklist de verificações realizadas na residência 1

A TABELA 3 mostra todos os itens verificados durante a segunda visita bimestral de manutenção preventiva realizada em novembro de 2021.

Tabela 3. Checklist de verificação da Residência 1

EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NECESSÁRIAS	QUANDO
SISTEMA DE POTÊNCIA		
Quadros elétricos C.C e C.A do sistema FV e do sistema de armazenamento	Todos os quadros elétricos C.C e C.A do sistema FV e do sistema de armazenamento deverão ser inspecionados utilizando uma câmera termográfica. Qualquer não homogeneidade de temperatura, em virtude de mau contato ou falha nos terminais, deverá ser avaliada e corrigida.	Conferido
Bateria de Lítio Mod.: B-Box battery Storage **Fabricante: BYD**	A bateria deve ser limpa periodicamente. Se o gabinete estiver sujo, usar uma escova macia seca ou um soprador de fuligem para remover a poeira. Líquidos como solventes, abrasivos ou líquidos corrosivos não podem ser empregados na limpeza do gabinete.	Conferido
	Realizar medições termográficas nos terminais da bateria avaliando não homogeneidade de temperatura entre condutores e terminais	Conferido
Inversor da Bateria Mod.: Sunny Island 6.0H Fabricante: SMA	O inversor da bateria deve ser limpo periodicamente. Se o inversor estiver sujo, limpar o invólucro, a tampa do invólucro, a etiqueta de tipo e os LEDs usando apenas um pano umedecido. Verificar se o inversor está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
	Verificar as mensagens de erro registradas. Isso revelará quaisquer erros ocultos na instalação ou configuração. Para mais	Conferido

	informações acessar a sessão “11.4 Checking the Function” do ANEXO II.	
	Verificar se os cabos nas conexões DC + e DC– estão bem presos (torque: 12 Nm), se as conexões estão livres de corrosão e se os cabos nas conexões AC1 e AC2 estão firmemente presos. Para mais informações acessar a sessão “11.5 Checking the Connections” do ANEXO II.	Conferido
	Realizar medições termográficas nos terminais do inversor avaliando não homogeneidade de temperatura entre condutores e terminais	Conferido
	Verificar se o estado atual da bateria corresponde ao estado esperado. Para mais informações acessar a sessão “11.6 Checking and Maintaining the Battery” do ANEXO II.	Conferido
	Verificar o ventilador. Em caso de aviso “W137 Derate” com frequência, um dos ventiladores provavelmente está com defeito ou bloqueado. Para isso é necessário fazer uma visita ao local e limpar ou desbloquear o ventilador. Para mais informações acessar a sessão “11.7 Cleaning the Fans” do ANEXO II.	Conferido
	Em caso de necessidade de substituição da bateria, acessar a sessão “11.8 Replacing the Battery” do ANEXO II para mais informações.	Conferido
SISTEMAS DE SENSORES		
Sensor de Velocidade do Vento Mod.: Wind Speed Sensor Compact Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar a orientação para o norte do sensor de velocidade do vento.	Conferido
Sensor de Irradiância Mod.: Irradiance Sensor Si-Series Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar a orientação e inclinação do sensor de irradiância no mesmo plano e orientação do sistema fotovoltaico da residência.	Conferido
Sensor de Temperatura do Módulo Mod.: PT1000 Adhesive Sensor Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o sensor de temperatura do módulo está colado na parte central de uma célula localizada no meio do módulo fotovoltaico.	Conferido
	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar se a fita de fixação do sensor está bem acomodada.	Conferido
Sensor de Temperatura Ambiente	Verificar se o sensor de temperatura ambiente está bem acomodado ao sistema fotovoltaico da residência.	Conferido

Mod.: PT1000 Sensor in Enclosure Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
Datalogger Mod.: Bluelog X-1000 Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o datalogger está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
SISTEMAS AUXILIARES		
Home Manager Mod.: Sunny Home Manager 2.0 Fabricante: SMA	Verificar se o Home manager está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
Medidor de Energia Mod.: IEM3155 – Energy Meter Fabricante: Schneider Electric	Verificar se o Medidor de Energia está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
Switch Mod.: Switch Cisco SF352-08 8-port 10/100 Managed Fabricante: Cisco	Verificar se o switch está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido

6.2 RESIDÊNCIA 2 – PRAIA DE FORA

A residência 2, localizada no bairro Praia de Fora - Palhoça, foi a segunda residência a ser visitada nesta terceira sequência de visitas de manutenção preventiva. A TABELA 4 indica a data e os responsáveis pela visita.


Tabela 4. Datas e responsáveis pelas visitas de manutenção preventiva da residência 2.

RESIDÊNCIA	RESPONSÁVEL		DATAS DAS VISITAS	RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO
Residência 2 Praia de Fora	Fernando Varela	3º	04/11/2021	Vitor Bairrão Amanda Mendes Ferreira Gomes

Ao iniciar a rotina de manutenção, uma inspeção visual foi feita. Ao constatar ausência de qualquer anomalia superficial no sistema, todos os quadros tiveram suas tampas retiradas. Bem como o inversor Sunny Island e a Bateria BYD.

Em seguida o *Sunny Portal* e o Datalogger Bluelog foram conferidos, bem como a instalação externa (sistema fotovoltaico, sensores externos e quadro de comunicação) e as conexões elétricas da instalação interna (bateria, inversor *Sunny Island* e quadros). Nenhuma anomalia foi encontrada. Assim, finalizou-se a rotina de manutenção como fechamento dos quadros, inversor e bateria.

A FIGURA 4 apresenta as imagens feitas durante a visita técnica, contendo as imagens de cada setor da instalação, bem como as imagens de antes e depois das correções.

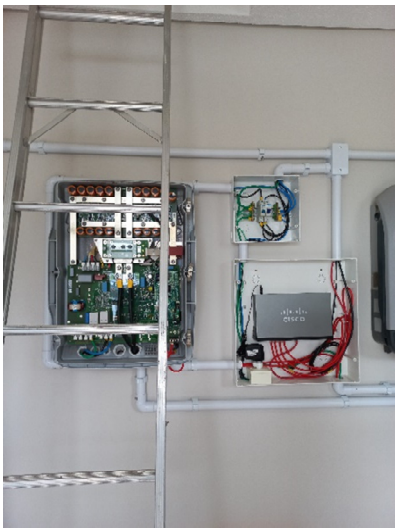


Vista geral do sistema



Bateria BYD




Inversor FV

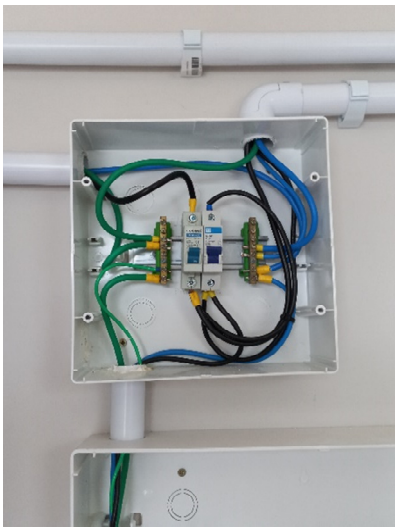


Quadro de disjuntores 1



Quadro de medidores

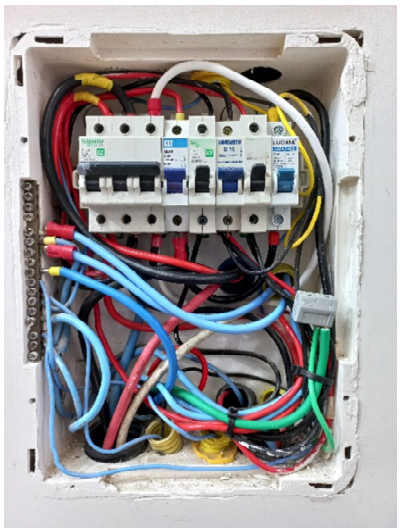

Quadro de disjuntores 2

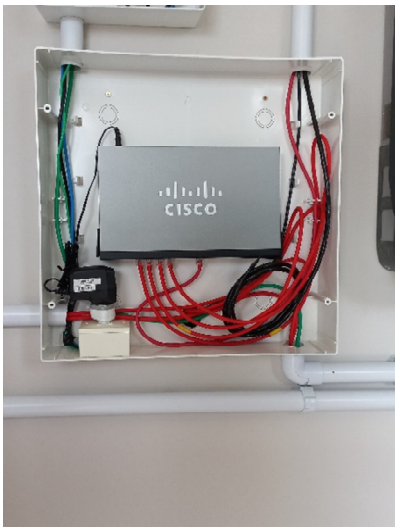


Quadro de Comunicação



Inversor Sunny Island aberto



Bateria BYD aberta

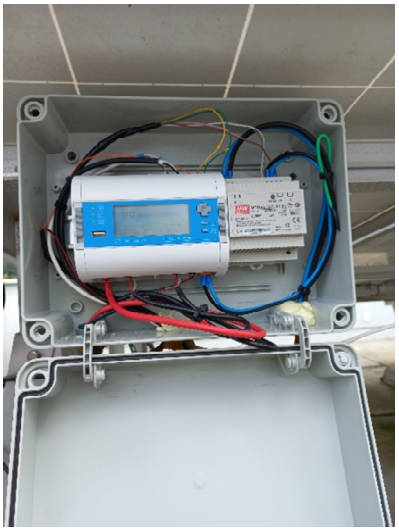

Caixa de comunicação 2



Sistema Fotovoltaico



Sensor de temperatura do módulo



Sensor de velocidade do vento



Célula de irradiância




Sensor de temperatura ambiente


Figura 4. Fotos do sistema de armazenamento, sensores e sistema FV da Residência 2.

Foram feitas imagens termográficas para verificar a possível existência de pontos quentes; contudo, nenhuma anomalia térmica foi encontrada. A FIGURA 5 apresenta as imagens termográficas dos medidores de energia, bateria *BYD*, inversor *Sunny Island*, quadro da residência, quadro de comunicação e quadro de medidores externo.


5

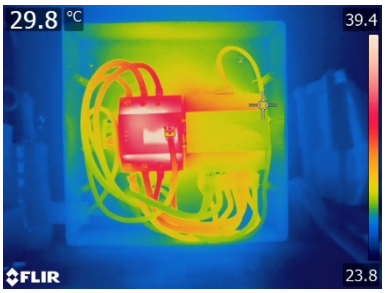


Medidores de energia

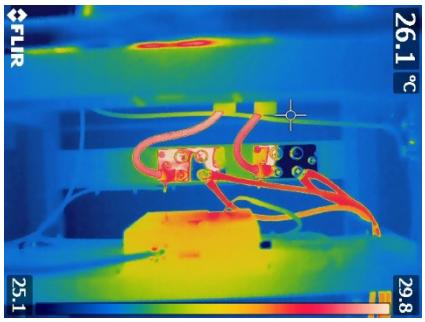


Bateria BYD

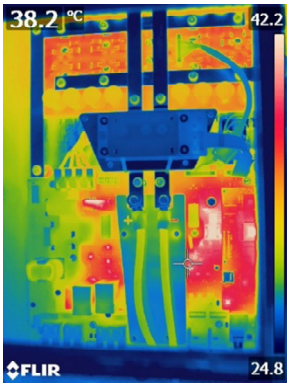

Sunny Island

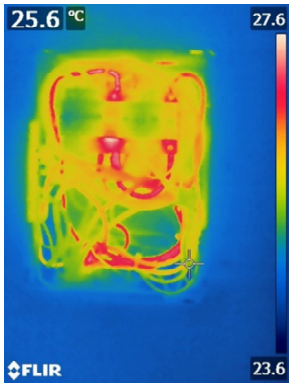

Quadro da Residência

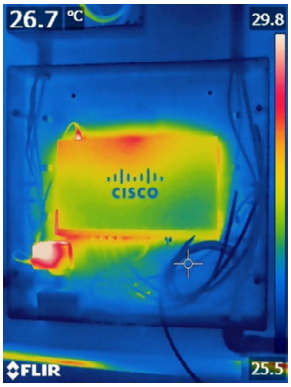

Quadro de Comunicação

Figura 5. Fotos termográficas do sistema de armazenamento, sensores e quadros da Residência 2.

A FIGURA 6 apresenta o registro diário de eventos para a residência 2.



17/11/2021 14:00:51	Home Manager 2 152	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	
16/11/2021 14:00:51	Home Manager 2 152	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	
16/11/2021 07:52:00	SI6.0H-13 318	Estado: Ok	
16/11/2021 07:50:00	SI6.0H-13 318	Estado: Aviso / Erro de bateria	
16/11/2021 04:54:30	SI6.0H-13 318	Estado: Ok	
16/11/2021 04:53:00	SI6.0H-13 318	Estado: Aviso / Erro de bateria	
15/11/2021 14:00:51	Home Manager 2 152	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	
14/11/2021 07:18:00	SI6.0H-13 318	Estado: Ok	
14/11/2021 07:15:30	SI6.0H-13 318	Estado: Aviso / Erro de bateria	
13/11/2021 01:48:01	SI6.0H-13 318	Estado: Ok	
12/11/2021 14:00:46	Home Manager 2 152	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	
11/11/2021 14:00:46	Home Manager 2 152	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	
10/11/2021 14:00:46	Home Manager 2 152	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	
09/11/2021 14:30:16	Home Manager 2 152	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	
08/11/2021 14:18:16	Home Manager 2 152	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	
08/11/2021 06:29:00	SI6.0H-13 318	Estado: Ok	

Figura 6. Registro diário dos eventos do sistema no portal Sunny Portal da Residência 2

6.2.1 Checklist de verificações realizadas na residência 2

A TABELA 5 mostra todos os itens verificados durante a terceira visita de manutenção preventiva bimestral realizada em novembro de 2021.

Tabela 5. Checklist de verificação da Residência 2.

EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NECESSÁRIAS	QUANDO
SISTEMA DE POTÊNCIA		
Quadros elétricos C.C e C.A do sistema FV e do sistema de armazenamento	Todos os quadros elétricos C.C e C.A do sistema FV e do sistema de armazenamento deverão ser inspecionados utilizando uma câmera termográfica. Qualquer não homogeneidade de temperatura, em virtude de mau contato ou falha nos terminais, deverá ser avaliada e corrigida.	Conferido
Bateria de Lítio Mod.: B-Box battery Storage **Fabricante: BYD**	A bateria deve ser limpa periodicamente. Se o gabinete estiver sujo, usar uma escova macia seca ou um soprador de fuligem para remover a poeira. Líquidos como solventes, abrasivos ou líquidos corrosivos não podem ser empregados na limpeza do gabinete.	Conferido
	Realizar medições termográficas nos terminais da bateria avaliando não homogeneidade de temperatura entre condutores e terminais	Conferido
Inversor da Bateria Mod.: Sunny Island 6.0H Fabricante: SMA	O inversor da bateria deve ser limpo periodicamente. Se o inversor estiver sujo, limpar o invólucro, a tampa do invólucro, a etiqueta de tipo e os LEDs usando apenas um pano umedecido. Verificar se o inversor está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
	Verificar as mensagens de erro registradas. Isso revelará quaisquer erros ocultos na instalação ou configuração. Para mais	Conferido

	informações acessar a sessão “11.4 Checking the Function” do ANEXO II.	
	Verificar se os cabos nas conexões DC + e DC– estão bem presos (torque: 12 Nm), se as conexões estão livres de corrosão e se os cabos nas conexões AC1 e AC2 estão firmemente presos. Para mais informações acessar a sessão “11.5 Checking the Connections” do ANEXO II.	Conferido
	Realizar medições termográficas nos terminais do inversor avaliando não homogeneidade de temperatura entre condutores e terminais	Conferido
	Verificar se o estado atual da bateria corresponde ao estado esperado. Para mais informações acessar a sessão “11.6 Checking and Maintaining the Battery” do ANEXO II.	Conferido
	Verificar o ventilador. Em caso de aviso “W137 Derate” com frequência, um dos ventiladores provavelmente está com defeito ou bloqueado. Para isso é necessário fazer uma visita ao local e limpar ou desbloquear o ventilador. Para mais informações acessar a sessão “11.7 Cleaning the Fans” do ANEXO II.	Conferido
	Em caso de necessidade de substituição da bateria, acessar a sessão “11.8 Replacing the Battery” do ANEXO II para mais informações.	Conferido
SISTEMAS DE SENSORES		
Sensor de Velocidade do Vento Mod.: Wind Speed Sensor Compact Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar a orientação para o norte do sensor de velocidade do vento.	Conferido
Sensor de Irradiância Mod.: Irradiance Sensor Si-Series Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar a orientação e inclinação do sensor de irradiância no mesmo plano e orientação do sistema fotovoltaico da residência.	Conferido
Sensor de Temperatura do Módulo Mod.: PT1000 Adhesive Sensor Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o sensor de temperatura do módulo está colado na parte central de uma célula localizada no meio do módulo fotovoltaico.	Conferido
	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar se a fita de fixação do sensor está bem acomodada.	Conferido
Sensor de Temperatura Ambiente	Verificar se o sensor de temperatura ambiente está bem acomodado ao sistema fotovoltaico da residência.	Conferido

Mod.: PT1000 Sensor in Enclosure Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
Datalogger Mod.: Bluelog X-1000 Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o datalogger está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
SISTEMAS AUXILIARES		
Home Manager Mod.: Sunny Home Manager 2.0 Fabricante: SMA	Verificar se o Home manager está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
Medidor de Energia Mod.: IEM3155 – Energy Meter Fabricante: Schneider Electric	Verificar se o Medidor de Energia está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
Switch Mod.: Switch Cisco SF352-08 8-port 10/100 Managed Fabricante: Cisco	Verificar se o switch está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido

6.3 RESIDÊNCIA 3 – CACUPÉ

A residência 3, localizada no bairro Cacupé – Florianópolis, foi a quinta residência a ser visitada nesta terceira sequência de visitas de manutenção preventiva bimestral. A TABELA 6 indica a data e os responsáveis pela visita.

Tabela 6. Datas e responsáveis pelas visitas de manutenção preventiva da residência 3.

RESIDÊNCIA	RESPONSÁVEL		DATAS DAS VISITAS	RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO
Residência 3 Cacupé	Alexandre Nunes Zucarato	3º	05/11/2021	Vitor Bairrão Amanda Mendes Ferreira Gomes

Ao iniciar a manutenção preventiva, após inspeção visual, os quadros, o inversor e a bateria foram abertos.

A FIGURA 7 apresenta as imagens feitas durante a visita técnica, contendo as imagens de cada setor da instalação, bem como as imagens de antes e depois das correções.




Vista geral do sistema



Bateria BYD




Inversor Fotovoltaico

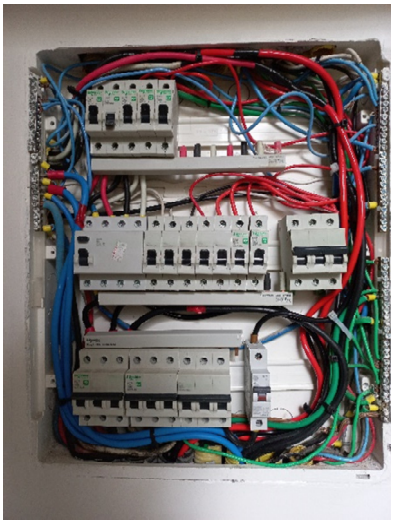


Quadro de disjuntores 1



Quadro de medidores

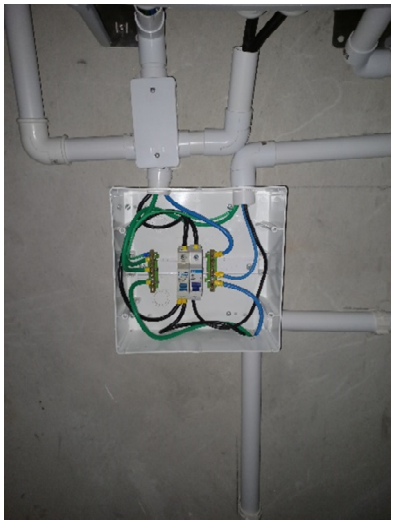


Quadro de disjuntores 2

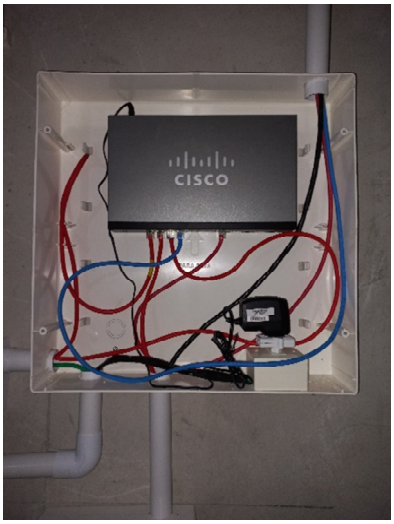

Quadro de Comunicação



Inversor Sunny Island aberto

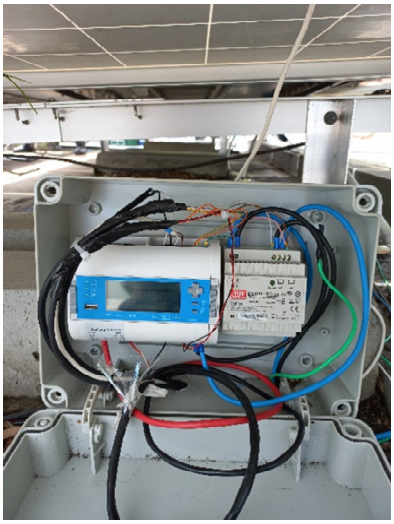

Caixa de comunicação 2



Sistema Fotovoltaico



Sensor de temperatura do módulo



Sensor de velocidade do vento




Célula de irradiância




Sensor de temperatura ambiente

Figura 7. Fotos do sistema de armazenamento, sensores e sistema FV da Residência 3.


Nenhum ponto quente foi encontrado através das inspeções termográficas realizadas. A FIGURA 8 apresenta as imagens termográficas dos medidores de energia, bateria *BYD*, inversor *Sunny Island*, quadro da residência e quadro de comunicação.

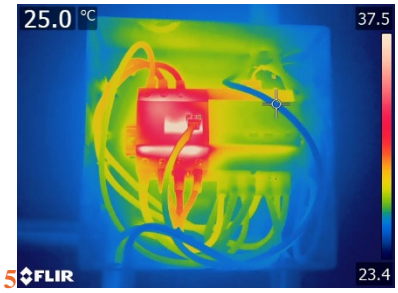

Medidores de energia

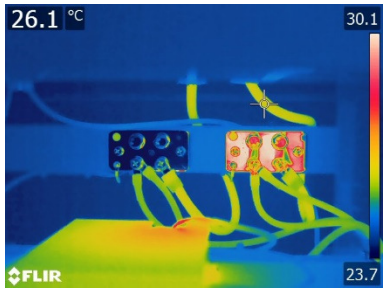

Bateria BYD

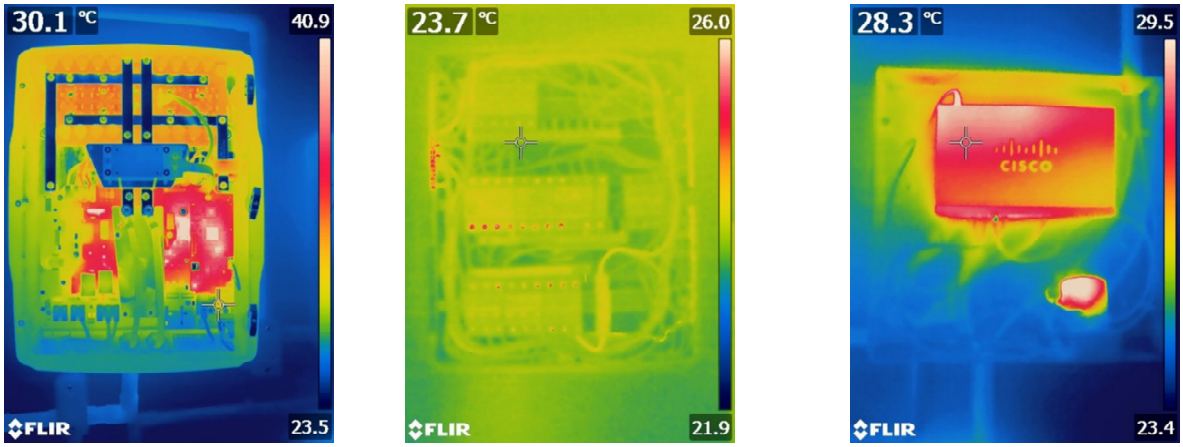

Sunny Island | Quadro da Residência | Quadro de Comunicação

Figura 8. Fotos termográficas do sistema de armazenamento, sensores e quadros da Residência 3

Todo o sistema foi inspecionado para verificar a existência de poeira. Mas, nada foi verificado.

Os dados do *Sunny Portal* e do datalogger *Bluelog* foram verificados a fim de analisar detalhadamente as atividades dos equipamentos e localizar possíveis pontos passíveis de correção. A FIGURA 9 apresenta o registro diário dos eventos para a residência 3.

17/11/2021 15:10:19	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
16/11/2021 15:00:19	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
16/11/2021 01:03:31	SI6.0H-13 317	Estado: Ok	✔
15/11/2021 14:38:32	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
12/11/2021 15:16:32	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
11/11/2021 14:47:32	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
10/11/2021 14:35:32	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
09/11/2021 15:10:32	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
08/11/2021 15:05:32	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
08/11/2021 01:23:30	SI6.0H-13 317	Estado: Ok	✔
05/11/2021 14:39:18	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
04/11/2021 15:59:18	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
03/11/2021 15:56:18	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
02/11/2021 15:35:18	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
01/11/2021 15:12:18	Home Manager 2 151	Carga da bateria completa antes do fim tempo (bateria carregada)	✔
31/10/2021 01:38:01	SI6.0H-13 317	Estado: Ok	✔

Figura 9. Registro diário dos eventos do sistema no portal Sunny Portal da Residência 3

Em seguida os equipamentos da área externa (sensores de temperatura, célula de referência e sensor anemométrico) bem como o sistema fotovoltaico foram conferidos e nenhuma anomalia foi constatada.

Nesta ocasião, um sistema de resfriamento dos módulos estava sendo instalado por uma outra equipe de pesquisadores. Estes solicitaram algumas explicações sobre a localização dos sensores externos. Ficando acordado que o painel que acomoda o sensor de temperatura do módulo não receberia o sistema de resfriamento para não afetar a aquisição dos dados de temperatura.

6.3.1 Checklist de verificações realizadas da Residência 3

A TABELA 7 mostra todos os itens verificados durante a terceira visita de manutenção preventiva bimestral realizada em novembro de 2021.

Tabela 7. Checklist de verificação da Residência 3.

EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NECESSÁRIAS	QUANDO
SISTEMA DE POTÊNCIA		
Quadros elétricos C.C e C.A do sistema FV e do sistema de armazenamento	Todos os quadros elétricos C.C e C.A do sistema FV e do sistema de armazenamento deverão ser inspecionados utilizando uma câmera termográfica. Qualquer não homogeneidade de temperatura, em virtude de mau contato ou falha nos terminais, deverá ser avaliada e corrigida.	Conferido
Bateria de Lítio Mod.: B-Box battery Storage **Fabricante: BYD**	A bateria deve ser limpa periodicamente. Se o gabinete estiver sujo, usar uma escova macia seca ou um soprador de fuligem para remover a poeira. Líquidos como solventes, abrasivos ou líquidos corrosivos não podem ser empregados na limpeza do gabinete.	Conferido
	Realizar medições termográficas nos terminais da bateria avaliando não homogeneidade de temperatura entre condutores e terminais	Conferido
Inversor da Bateria Mod.: Sunny Island 6.0H Fabricante: SMA	O inversor da bateria deve ser limpo periodicamente. Se o inversor estiver sujo, limpar o invólucro, a tampa do invólucro, a etiqueta de tipo e os LEDs usando apenas um pano umedecido. Verificar se o inversor está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
	Verificar as mensagens de erro registradas. Isso revelará quaisquer erros ocultos na instalação ou configuração. Para mais informações acessar a sessão “11.4 Checking the Function” do ANEXO II.	Conferido
	Verificar se os cabos nas conexões DC + e DC– estão bem presos (torque: 12 Nm), se as conexões estão livres de corrosão e se os cabos nas conexões AC1 e AC2 estão firmemente presos. Para mais informações acessar a sessão “11.5 Checking the Connections” do ANEXO II.	Conferido
	Realizar medições termográficas nos terminais do inversor avaliando não homogeneidade de temperatura entre condutores e terminais	Conferido
	Verificar se o estado atual da bateria corresponde ao estado esperado. Para mais informações acessar a sessão “11.6 Checking and Maintaining the Battery” do ANEXO II.	Conferido
	Verificar o ventilador. Em caso de aviso “W137 Derate” com frequência, um dos ventiladores provavelmente está com defeito	Conferido

	ou bloqueado. Para isso é necessário fazer uma visita ao local e limpar ou desbloquear o ventilador. Para mais informações acessar a sessão “11.7 Cleaning the Fans” do ANEXO II.	
	Em caso de necessidade de substituição da bateria, acessar a sessão “11.8 Replacing the Battery” do ANEXO II para mais informações.	Conferido
SISTEMAS DE SENSORES		
Sensor de Velocidade do Vento Mod.: Wind Speed Sensor Compact Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar a orientação para o norte do sensor de velocidade do vento.	Conferido
Sensor de Irradiância Mod.: Irradiance Sensor Si-Series Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar a orientação e inclinação do sensor de irradiância no mesmo plano e orientação do sistema fotovoltaico da residência.	Conferido
Sensor de Temperatura do Módulo Mod.: PT1000 Adhesive Sensor Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o sensor de temperatura do módulo está colado na parte central de uma célula localizada no meio do módulo fotovoltaico.	Conferido
	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar se a fita de fixação do sensor está bem acomodada.	Conferido
Sensor de Temperatura Ambiente Mod.: PT1000 Sensor in Enclosure Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o sensor de temperatura ambiente está bem acomodado ao sistema fotovoltaico da residência.	Conferido
	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
Datalogger Mod.: Bluelog X-1000 Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o datalogger está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
SISTEMAS AUXILIARES		
Home Manager Mod.: Sunny Home Manager 2.0 Fabricante: SMA	Verificar se o Home manager está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
Medidor de Energia Mod.: IEM3155 – Energy Meter Fabricante: Schneider Electric	Verificar se o Medidor de Energia está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido

Switch Mod.: Switch Cisco SF352-08 8-port 10/100 Managed Fabricante: Cisco	Verificar se o switch está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido

6.4 RESIDÊNCIA 4 – JURERÊ

A residência 4, localizada no bairro Jurerê Internacional, foi a primeira residência a ser visitada pela equipe de manutenção preventiva. A TABELA 8 indica a data e os responsáveis pela visita.

Tabela 8. Datas e responsáveis pelas visitas de manutenção preventiva da Residência 4.

RESIDÊNCIA	RESPONSÁVEL	DATAS DAS VISITAS		RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO
Residência 4 Jurerê	Julio Cesar Lunardi	3º	03/11/2021	Vitor Bairrão Amanda Mendes Ferreira Gomes

A rotina foi iniciada abrindo a tampa de todos os quadros, da bateria *BYD* e do inversor *Sunny Island*. Então verificou-se todos os setores do sistema. Nenhuma anomalia foi constatada.

A FIGURA 10 apresenta as imagens feitas durante a visita técnica, contendo as imagens de cada setor da instalação.




Vista geral do sistema



Bateria BYD



Inversor Fotovoltaico

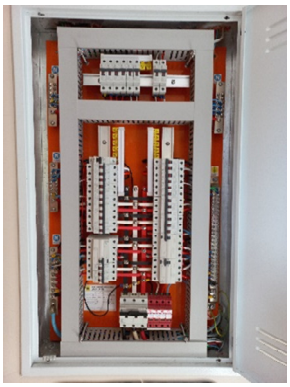

Quadro de disjuntores 1



Quadro de medidores



Quadro de disjuntores 2



Quadro de Comunicação




Inversor Sunny Island aberto



Bateria BYD aberta



Sistema Fotovoltaico

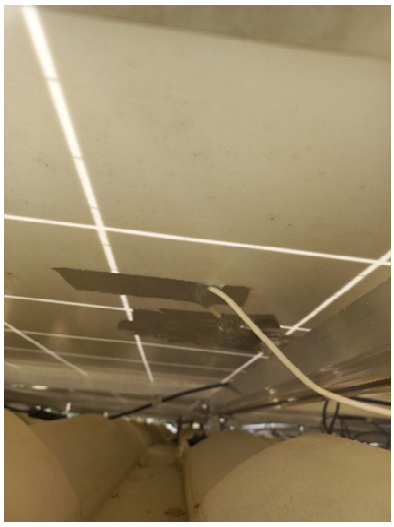

Sensor de temperatura do módulo



Sensor de velocidade do vento




Célula de irradiância




Sensor de temperatura ambiente

Figura 10. Fotos do sistema de armazenamento, sensores e sistema FV da Residência 4.


Foi realizada a inspeção visual e termográfica para localizar possíveis pontos de aquecimento nos terminais e componentes. Não foram encontrados pontos de aquecimento durante a inspeção. A FIGURA 11 apresenta as imagens termográficas dos medidores de energia, bateria *BYD*, inversor *Sunny Island*, quadro da residência e quadro de comunicação. Ao fim da inspeção, todos os quadros, inversor *Sunny Island* e bateria *BYD* foram devidamente fechados.

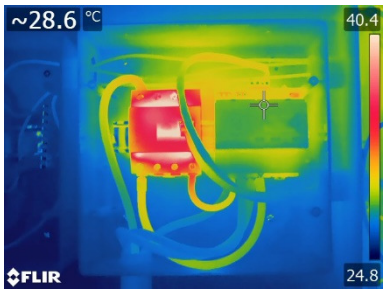

Medidores de energia

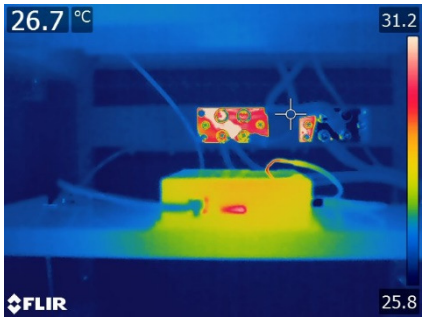


Bateria BYD

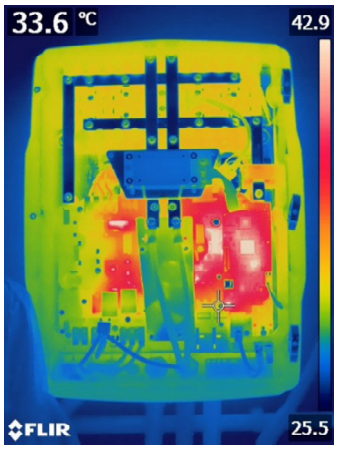

Sunny Island



Quadro da Residência

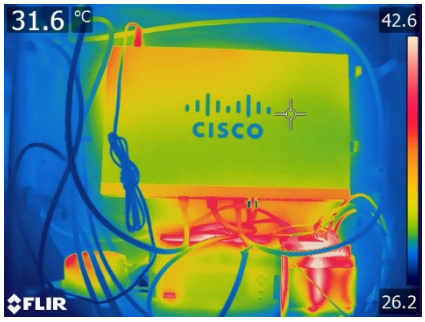

Quadro de Comunicação

Figura 11. Fotos termográficas do sistema de armazenamento, sensores e quadros da Residência 4.

Verificou-se os dados do *Sunny Portal* e do datalogger *Bluelog* afim de analisar detalhadamente as atividades dos equipamentos e localizar possíveis pontos passíveis de correção. A FIGURA 12 apresenta o registro diário dos eventos para a residência 4.

	16/11/2021 08:33:57	Home Manager 2 156	Comunicação com o aparelho restabelecida.	
	16/11/2021 08:28:57	Home Manager 2 156	A comunicação com o Sunny Portal falhou durante 02:02 horas	
	16/11/2021 07:40:15	Home Manager 2 156	Falha de comunicação: o contacto com o aparelho está atrasado (última recepção de dados: 16/11/2021 06:20:00)	
	15/11/2021 01:23:30	SI6.0H-13 310	Estado: Ok	
	08/11/2021 20:33:31	SI6.0H-13 310	Estado: Ok	
	08/11/2021 20:33:01	SI6.0H-13 310	Estado: Aviso	
	07/11/2021 23:43:00	SI6.0H-13 310	Estado: Ok	
	01/11/2021 03:53:00	SI6.0H-13 310	Estado: Ok	
	01/11/2021 03:36:15	SI6.0H-13 310	Comunicação com falha	
	01/11/2021 03:11:58	SI6.0H-13 310	Comunicação com falha	
	01/11/2021 03:00:01	SI6.0H-13 310	Estado: Ok	
	01/11/2021 02:05:31	SI6.0H-13 310	Comunicação com falha	
	01/11/2021 01:12:22	SI6.0H-13 310	Comunicação com falha	
	31/10/2021 23:38:01	SI6.0H-13 310	Estado: Ok	
	31/10/2021 23:37:17	Home Manager 2 156	Mudança de hora efectuada / hora nova	
	31/10/2021 00:12:01	SI6.0H-13 310	Estado: Ok	

Figura 12. Registro diário dos eventos do sistema no portal Sunny Portal da Residência 4

6.4.1 Checklist de verificações realizadas da Residência 4

A TABELA 9 mostra todos os itens verificados durante a terceira visita de manutenção preventiva bimestral realizada em novembro de 2021.

Tabela 9. Checklist de verificação da Residência 4.

EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NECESSÁRIAS	QUANDO
SISTEMA DE POTÊNCIA		
Quadros elétricos C.C e C.A do sistema FV e do sistema de armazenamento	Todos os quadros elétricos C.C e C.A do sistema FV e do sistema de armazenamento deverão ser inspecionados utilizando uma câmera termográfica. Qualquer não homogeneidade de temperatura, em virtude de mau contato ou falha nos terminais, deverá ser avaliada e corrigida.	Conferido
Bateria de Lítio Mod.: B-Box battery Storage **Fabricante: BYD**	A bateria deve ser limpa periodicamente. Se o gabinete estiver sujo, usar uma escova macia seca ou um soprador de fuligem para remover a poeira. Líquidos como solventes, abrasivos ou líquidos corrosivos não podem ser empregados na limpeza do gabinete.	Conferido
	Realizar medições termográficas nos terminais da bateria avaliando não homogeneidade de temperatura entre condutores e terminais	Conferido
Inversor da Bateria Mod.: Sunny Island 6.0H Fabricante: SMA	O inversor da bateria deve ser limpo periodicamente. Se o inversor estiver sujo, limpar o invólucro, a tampa do invólucro, a etiqueta de tipo e os LEDs usando apenas um pano umedecido. Verificar se o inversor está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
	Verificar as mensagens de erro registradas. Isso revelará quaisquer erros ocultos na instalação ou configuração. Para mais	Conferido

	informações acessar a sessão “11.4 Checking the Function” do ANEXO II.	
	Verificar se os cabos nas conexões DC + e DC– estão bem presos (torque: 12 Nm), se as conexões estão livres de corrosão e se os cabos nas conexões AC1 e AC2 estão firmemente presos. Para mais informações acessar a sessão “11.5 Checking the Connections” do ANEXO II.	Conferido
	Realizar medições termográficas nos terminais do inversor avaliando não homogeneidade de temperatura entre condutores e terminais	Conferido
	Verificar se o estado atual da bateria corresponde ao estado esperado. Para mais informações acessar a sessão “11.6 Checking and Maintaining the Battery” do ANEXO II.	Conferido
	Verificar o ventilador. Em caso de aviso “W137 Derate” com frequência, um dos ventiladores provavelmente está com defeito ou bloqueado. Para isso é necessário fazer uma visita ao local e limpar ou desbloquear o ventilador. Para mais informações acessar a sessão “11.7 Cleaning the Fans” do ANEXO II.	Conferido
	Em caso de necessidade de substituição da bateria, acessar a sessão “11.8 Replacing the Battery” do ANEXO II para mais informações.	Conferido
SISTEMAS DE SENSORES		
Sensor de Velocidade do Vento Mod.: Wind Speed Sensor Compact Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar a orientação para o norte do sensor de velocidade do vento.	Conferido
Sensor de Irradiância Mod.: Irradiance Sensor Si-Series Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar a orientação e inclinação do sensor de irradiância no mesmo plano e orientação do sistema fotovoltaico da residência.	Conferido
Sensor de Temperatura do Módulo Mod.: PT1000 Adhesive Sensor Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o sensor de temperatura do módulo está colado na parte central de uma célula localizada no meio do módulo fotovoltaico.	Conferido
	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar se a fita de fixação do sensor está bem acomodada.	Conferido
Sensor de Temperatura Ambiente	Verificar se o sensor de temperatura ambiente está bem acomodado ao sistema fotovoltaico da residência.	Conferido

Mod.: PT1000 Sensor in Enclosure Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
Datalogger Mod.: Bluelog X-1000 Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o datalogger está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
SISTEMAS AUXILIARES		
Home Manager Mod.: Sunny Home Manager 2.0 Fabricante: SMA	Verificar se o Home manager está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
Medidor de Energia Mod.: IEM3155 – Energy Meter Fabricante: Schneider Electric	Verificar se o Medidor de Energia está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
Switch Mod.: Switch Cisco SF352-08 8-port 10/100 Managed Fabricante: Cisco	Verificar se o switch está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido

6.5 RESIDÊNCIA 5 – PANTANAL

A residência 5, localizada no bairro Pantanal, foi a terceira residência a ser visitada nesta terceira fase de manutenções preventivas. A TABELA 10 indica a data e os responsáveis pela visita.

Tabela 10. Datas e responsáveis pelas visitas de manutenção da residência 5.

RESIDÊNCIA	RESPONSÁVEL		DATAS DAS VISITAS	RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO
Residência 5 Pantanal	Rafael José Caron Bósio	2º	05/11/2021	Vitor Bairrão Amanda Mendes Ferreira Gomes

Ao iniciar a visita, todas as tampas dos quadros foram retiradas. Efetuou-se a inspeção visual e nenhuma anomalia foi observada. No sistema externo, constatou-se a oxidação do parafuso de fixação da célula de referência. A substituição do componente foi efetuada.

A FIGURA 13 apresenta as imagens feitas durante a visita técnica, contendo as imagens de cada setor da instalação, bem como as imagens de antes e depois das correções.




Vista geral do sistema



Bateria BYD




Inversor Fotovoltaico

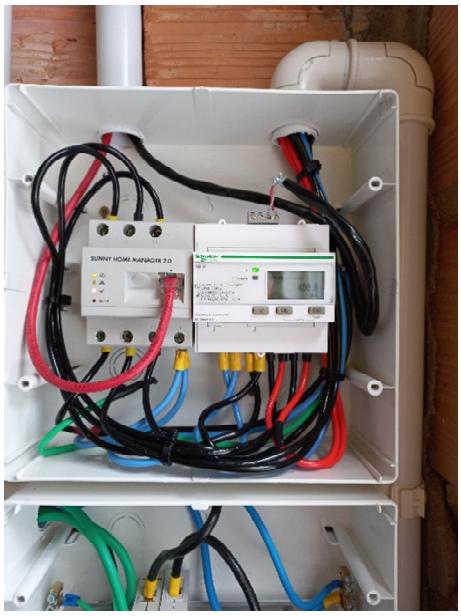


Quadro de medidores



Quadro de disjuntores 2

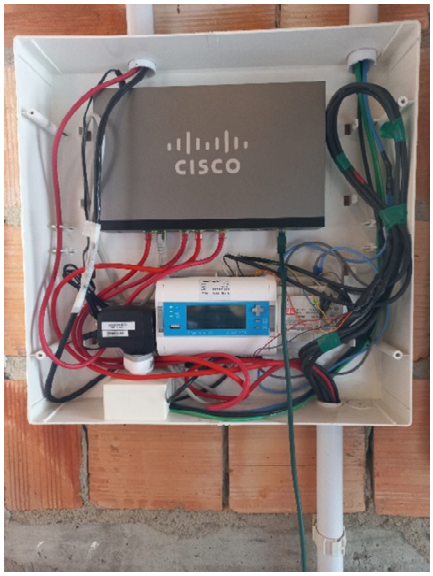

Quadro de Comunicação

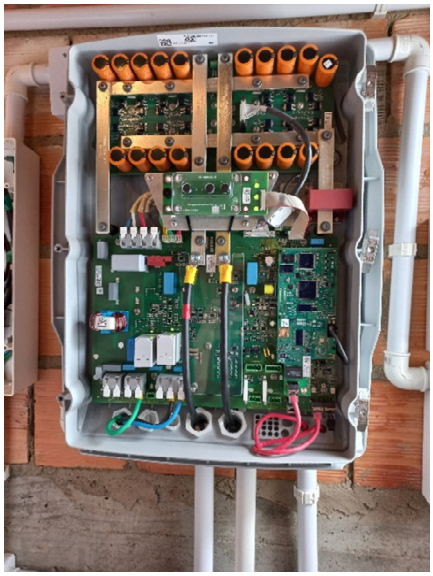

Inversor Sunny Island aberto



Bateria BYD aberta




Sistema Fotovoltaico



Sensor de temperatura do módulo





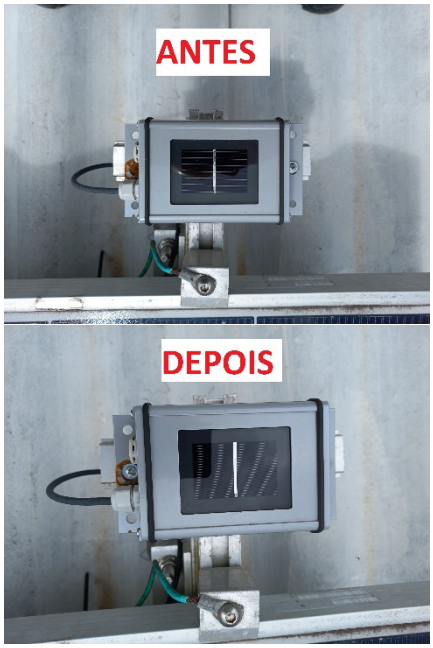

Sensor de velocidade do vento **Célula de irradiância** **Sensor de temperatura ambiente**

Figura 13. Fotos do sistema de armazenamento, sensores e sistema FV da Residência 5.


Além disso, os demais dados do *Sunny Portal* e do datalogger *Bluelog* foram verificados afim de analisar detalhadamente as atividades dos equipamentos e localizar possíveis pontos passíveis de correção. A **FIGURA 14** apresenta o registro diário dos eventos para a residência 5.

⚠	16/11/2021 18:25:05	Home Manager 2 147	Lembrete: ainda existe uma falha de comunicação com o aparelho (última receoção de dados: 15/11/2021 17:01:00)
⚠	15/11/2021 18:20:21	Home Manager 2 147	Falha de comunicação: o contacto com o aparelho está atrasado (última recepção de dados: 15/11/2021 17:01:00)
ℹ	15/11/2021 17:04:09	Home Manager 2 147	Comunicação com o aparelho restabelecida.
⚠	14/11/2021 18:18:11	Home Manager 2 147	Lembrete: ainda existe uma falha de comunicação com o aparelho (última receoção de dados: 13/11/2021 17:01:00)
⚠	13/11/2021 18:17:43	Home Manager 2 147	Falha de comunicação: o contacto com o aparelho está atrasado (última recepção de dados: 13/11/2021 17:01:00)
ℹ	13/11/2021 17:06:39	Home Manager 2 147	Comunicação com o aparelho restabelecida.
⚠	13/11/2021 14:07:51	Home Manager 2 147	Lembrete: ainda existe uma falha de comunicação com o aparelho (última receoção de dados: 12/11/2021 12:51:00)
⚠	12/11/2021 14:07:42	Home Manager 2 147	Falha de comunicação: o contacto com o aparelho está atrasado (última recepção de dados: 12/11/2021 12:51:00)
ℹ	12/11/2021 12:51:34	Home Manager 2 147	Comunicação com o aparelho restabelecida.
⚠	11/11/2021 21:52:38	Home Manager 2 147	Lembrete: ainda existe uma falha de comunicação com o aparelho (última receoção de dados: 10/11/2021 20:35:00)
⚠	10/11/2021 21:51:08	Home Manager 2 147	Falha de comunicação: o contacto com o aparelho está atrasado (última recepção de dados: 10/11/2021 20:35:00)
ℹ	10/11/2021 20:39:55	Home Manager 2 147	Comunicação com o aparelho restabelecida.
⚠	10/11/2021 12:40:59	Home Manager 2 147	Lembrete: ainda existe uma falha de comunicação com o aparelho (última receoção de dados: 08/11/2021 11:20:00)
⚠	09/11/2021 12:40:52	Home Manager 2 147	Lembrete: ainda existe uma falha de comunicação com o aparelho (última receoção de dados: 08/11/2021 11:20:00)
⚠	08/11/2021 12:36:28	Home Manager 2 147	Falha de comunicação: o contacto com o aparelho está atrasado (última recepção de dados: 08/11/2021 11:20:00)
ℹ	08/11/2021 11:25:20	Home Manager 2 147	Comunicação com o aparelho restabelecida.

Figura 14. Registro diário dos eventos do sistema no portal Sunny Portal da Residência 5

Foi realizada a inspeção visual e imagem termográfica para localizar possíveis pontos de aquecimento nos terminais e componentes. Não foram encontrados pontos de aquecimento nas

inspeções. A FIGURA 15 apresenta as imagens termográficas dos medidores de energia, bateria *BYD*, inversor *Sunny Island*, quadro da residência e quadro de comunicação.

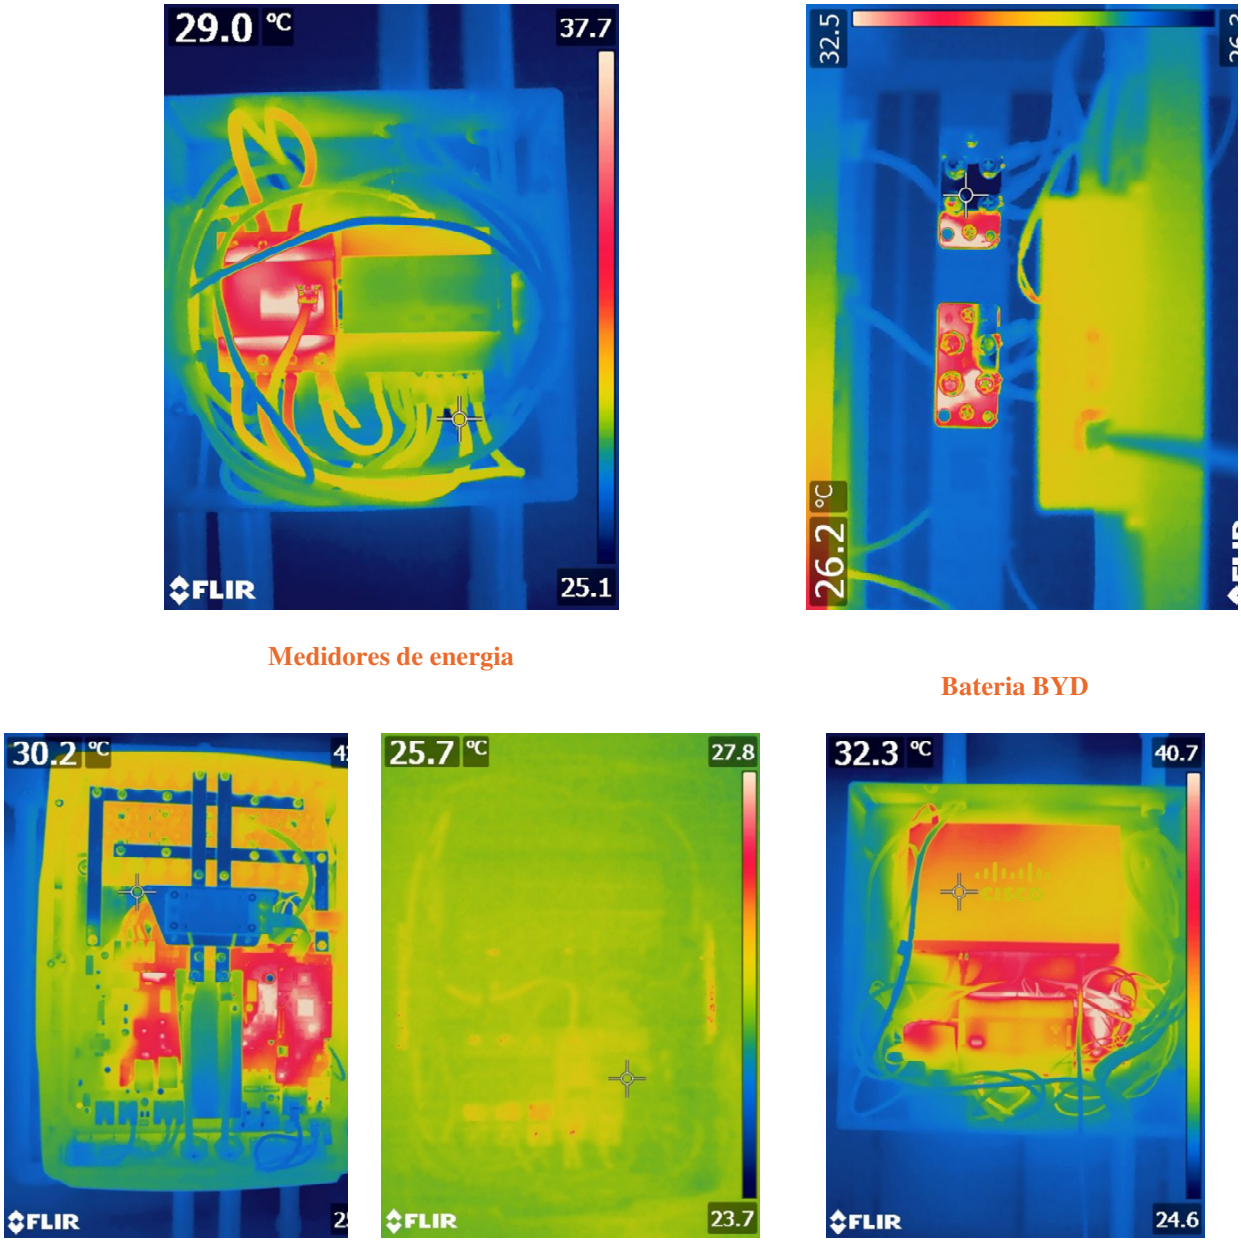

Medidores de energia

Bateria BYD

Sunny Island

Quadro da Residência

Quadro de Comunicação

Figura 15. Fotos termográficas do sistema de armazenamento, sensores e quadros da Residência 5.

Por fim, todos os quadros, o inversor e a bateria foram fechados e a manutenção preventiva foi encerrada.

6.5.1 Checklist de verificações realizadas na residência 5

A TABELA 11 mostra todos os itens verificados durante a terceira visita de manutenção bimestral realizada em novembro de 2021.

Tabela 11. Checklist de verificação da Residência 5.

EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NECESSÁRIAS	QUANDO
SISTEMA DE POTÊNCIA		
Quadros elétricos C.C e C.A do sistema FV e do sistema de armazenamento	Todos os quadros elétricos C.C e C.A do sistema FV e do sistema de armazenamento deverão ser inspecionados utilizando uma câmera termográfica. Qualquer não homogeneidade de temperatura, em virtude de mau contato ou falha nos terminais, deverá ser avaliada e corrigida.	Conferido
Bateria de Lítio Mod.: B-Box battery Storage **Fabricante: BYD**	A bateria deve ser limpa periodicamente. Se o gabinete estiver sujo, usar uma escova macia seca ou um soprador de fuligem para remover a poeira. Líquidos como solventes, abrasivos ou líquidos corrosivos não podem ser empregados na limpeza do gabinete.	Conferido
	Realizar medições termográficas nos terminais da bateria avaliando não homogeneidade de temperatura entre condutores e terminais	Conferido
Inversor da Bateria Mod.: Sunny Island 6.0H Fabricante: SMA	O inversor da bateria deve ser limpo periodicamente. Se o inversor estiver sujo, limpar o invólucro, a tampa do invólucro, a etiqueta de tipo e os LEDs usando apenas um pano umedecido. Verificar se o inversor está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
	Verificar as mensagens de erro registradas. Isso revelará quaisquer erros ocultos na instalação ou configuração. Para mais informações acessar a sessão “11.4 Checking the Function” do ANEXO II.	Conferido
	Verificar se os cabos nas conexões DC + e DC– estão bem presos (torque: 12 Nm), se as conexões estão livres de corrosão e se os cabos nas conexões AC1 e AC2 estão firmemente presos. Para mais informações acessar a sessão “11.5 Checking the Connections” do ANEXO II.	Conferido
	Realizar medições termográficas nos terminais do inversor avaliando não homogeneidade de temperatura entre condutores e terminais	Conferido
	Verificar se o estado atual da bateria corresponde ao estado esperado. Para mais informações acessar a sessão “11.6 Checking and Maintaining the Battery” do ANEXO II.	Conferido
	Verificar o ventilador. Em caso de aviso “W137 Derate” com frequência, um dos ventiladores provavelmente está com defeito ou bloqueado. Para isso é necessário fazer uma visita ao local e limpar ou desbloquear o ventilador. Para mais informações acessar a sessão “11.7 Cleaning the Fans” do ANEXO II.	Conferido

	Em caso de necessidade de substituição da bateria, acessar a sessão “11.8 Replacing the Battery” do ANEXO II para mais informações.	Conferido
SISTEMAS DE SENSORES		
Sensor de Velocidade do Vento Mod.: Wind Speed Sensor Compact Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar a orientação para o norte do sensor de velocidade do vento.	Conferido
Sensor de Irradiância Mod.: Irradiance Sensor Si-Series Fabricante: Meteocontrol	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar a orientação e inclinação do sensor de irradiância no mesmo plano e orientação do sistema fotovoltaico da residência.	Conferido
Sensor de Temperatura do Módulo Mod.: PT1000 Adhesive Sensor Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o sensor de temperatura do módulo está colado na parte central de uma célula localizada no meio do módulo fotovoltaico.	Conferido
	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
	Verificar se a fita de fixação do sensor está bem acomodada.	Conferido
Sensor de Temperatura Ambiente Mod.: PT1000 Sensor in Enclosure Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o sensor de temperatura ambiente está bem acomodado ao sistema fotovoltaico da residência.	Conferido
	Verificar se os cabos de comunicação estão devidamente conectados.	Conferido
Datalogger Mod.: Bluelog X-1000 Fabricante: Meteocontrol	Verificar se o datalogger está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
SISTEMAS AUXILIARES		
Home Manager Mod.: Sunny Home Manager 2.0 Fabricante: SMA	Verificar se o Home manager está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido
Medidor de Energia Mod.: IEM3155 – Energy Meter Fabricante: Schneider Electric	Verificar se o Medidor de Energia está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido

Switch Mod.: Switch Cisco SF352-08 8-port 10/100 Managed Fabricante: Cisco	Verificar se o switch está livre de poeira e outras sujeiras. Remover cuidadosamente a sujeira pesada com uma escova macia.	Conferido

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A terceira rodada de manutenção preventiva ocorreu conforme o planejado. Devido às correções executadas nas manutenções anteriores o sistema se encontra bastante estável e não foram necessárias correções expressivas. Salvo parafusos oxidados.

Durante as manutenções, constatou-se que os parafusos de fixação da tampa das caixas denominadas como " quadro de comunicação 2", onde está alocado o *Datalogger Bluelog*, estão com a fenda comprometida devido a ação de abrir e fechar as caixas durante as manutenções. Por se tratar de um componente fabricado em polímero, o objeto não suportou bem aplicação de torque por várias vezes. Como solução, sugeriu-se que os parafusos citados fossem substituídos por peças fabricadas em metal. Esta situação foi constatada de forma geral em todas as residências.
